



資器材を担いで作業箇所をめざす (正面は大松倉山)

【メモ】

実施日時：2018(H30)/07/15(日) 9:00～16:00頃

場所：犬倉分岐～大松倉山裾間
約1.1km区間 9箇所

作業内容：水切り補修および木歩道設置等

ほかにセイヨウタンポポ駆除

搬入材料：古板材18枚(長尺6、短尺12)、

カスガイ25個(購入品)

※古板材は休暇村提供

搬入器材：スコップ3丁

ミニツルハシ1丁、カケヤ1丁

鋸、鉋、ハンマー ほか

成果：水切り補修5箇所

木歩道設置2か所(水切り併設1ヶ所)


(古板材使用1ヶ所、倒木敷設1ヶ所)

洗掘防止土止め2ヶ所、階段1ヶ所

セイヨウタンポポ駆除0.4kg、80本

参加者：(VC)大堀、(PV)米田、家子、広野、

三上、民部田、阿部

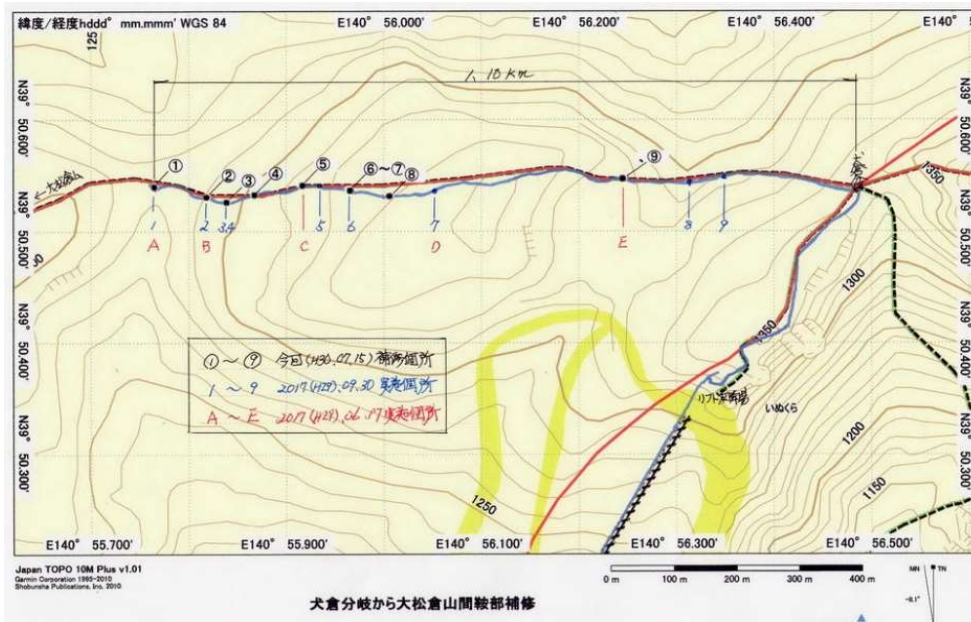

リフト終点にて 作業参加者

【①地点】水切り補修と木歩道設置



作業着手前現況 前年度設置の水切りが効果を発揮していた



木歩道完成



同左 (大松倉山側から)



完成した水切り

《作業状況》



①地点に到着



水切り補修



水切り側壁に古板材使用



①地点の整備完了して

【②地点】水切り補修



【③地点】水切り補修



【④地点】土止め設置



(枯損木利用)

【⑤地点】階段設置



(枯損木利用)



【⑥地点】水切り補修



【⑦地点】水切り補修



【⑧地点】土止め設置



（古板材1枚を使用）

【⑨地点】木歩道（倒木・枯損木敷設）



⑨地点 枯損木等敷設完了

【セイヨウタンポポ駆除】

第三リフト終点付近に侵入が確認されたので、登山時に広野P.V.が単独で駆除作業し、下山時に参加者全員で残余を駆除した。この日の駆除量は0.4kg、80本であった。



駆除したセイヨウタンポポ
（撮影：広野）
