



完成したイグルー前にて、参加者一同 (外に1名参加した)

【メモ】

【日時】令和3年1月20日(水) 9:00~12:30頃

【場所】網張VC周辺(網張温泉神社境内)

【参加者総数】 10名
 パークボランティア 5名
 網張VCOB 1名
 滝沢市観光物産課 1名
 雫石観光協会 3名

【概況】 (文責：阿部)

- ・ 吹雪で厳しい寒さの中だったが、予定どおり、イグルー2基を完成させることが出来た。
- ・ イグルーはPV広野氏の指導により2通りの方法で製作したが、参加PVは前年の経験もあり、手際よく作業して立派に完成させることが出来た。
- ・ 今回は滝沢市職員と雫石観光協会職員がイグルーづくり体験のため参加した。
- ・ 作業中に網張の森スノーシュートレッキングのグループが立ち寄り、興味深げに見学していた。
- ・ 今回製作したイグルーは網張の森スノーシュートレッキングなどに活用されることを期待する。

(今回参加PV等) 6名 (敬称略、順不同)
 広野、大堀、米田、米澤、吉田、阿部

【コロナ感染予防対策】



体温確認と、VC玄関で手の消毒を実施

【作業前のミーティング】



全員マスク装着、出来るだけ離れて着席

※ブロックづくり作業中もマスク装着を心掛けた



PV広野氏から作業要領等説明
 手書きの略図を使用 (末尾に掲載)

【作業開始】〈雪の踏み固め〉



雪ブロック切り出し予定範囲と、イグルーを作る場所を全員で踏み固めた
 踏み固め後、15分程度で雪がしっかり固結する




〈ブロック切り出し〉



出来るだけ均一な形状が望ましいが、今回は雪質変化層で分離し易かった

〈イグルーづくり〉 内部に雪を詰めて支保工代わりにして積上げる方法と、ブロックだけで積上げる方法の二通りの方法で実施したが、今回はブロックだけで造る作業を記録した。

※ 雪ブロックに中心に向かって先細のテーパを付けて繋ぎながら積上げる (雪ブロックの側面がイグルーの中心に向かうように整形する)

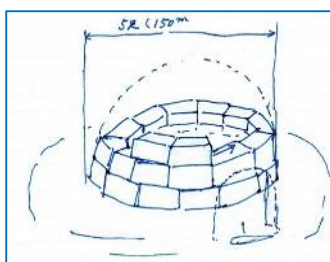

イメージ図 (広野孝男氏作)



ブロック積みの終盤、天井部を絞るのに注意を要する




入口は最後に穴開け



「簡易型イグルー」製作グループと指導のPV広野氏
ブロック積みと並行して中に雪を詰め支保工代わりとし、
天井ブロック等支えながら形成する。最後に中の雪を掘り出す



「イグルー」製作グループと指導のPV広野氏
雪を中詰せず、ブロックだけで積上げる
中段から天井への絞り込みが難しい

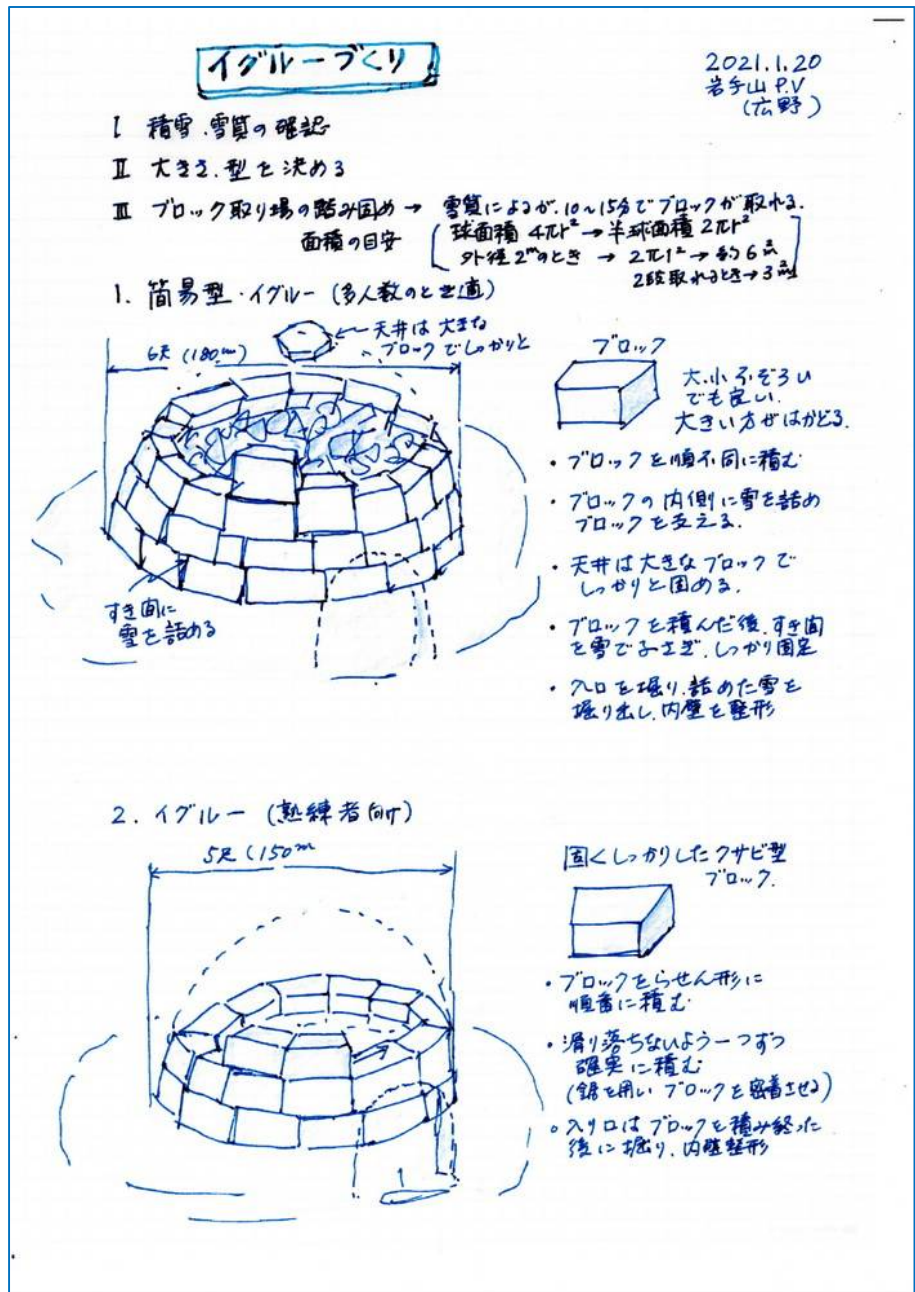

事前にPV広野氏から参加者に配布された作業要領図 (広野孝男氏作成)
